
وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH

تقرير الإنجاز الأسبوعي

5 نوفمبر 2026



إجمالي المهام	مكتملة	على المخطط	متأخرة	معلقة
22	2	20	0	0

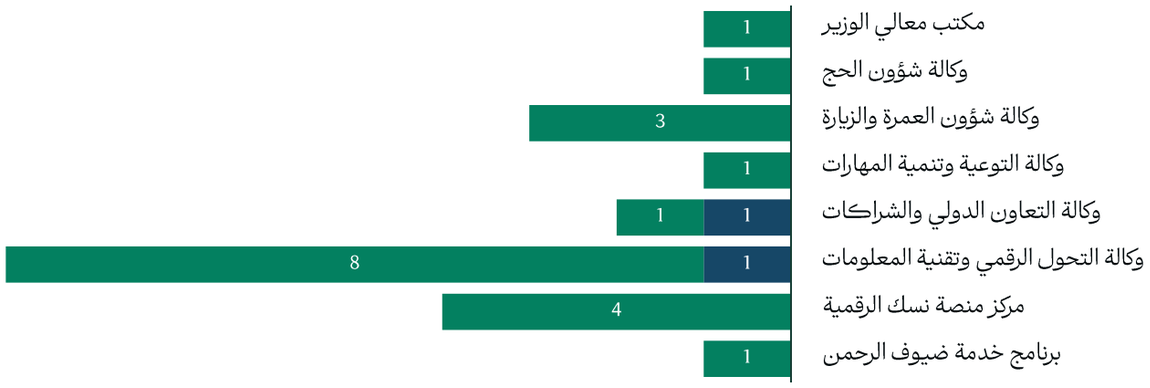

المهام المكتملة

#	المهمة	القطاع	ملاحظات
1	التنسيق مع وكالة التعاون الدولي لمتابعة وتنظيم زيارات كبار الشخصيات والوفود الرسمية خلال مؤتمر ومعرض الحج 2026 وإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبالهم في بوث وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	تم التنسيق مع وكالة التعاون الدولي
2	عقد اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية لمناقشة التحديات بخصوص إعادة تفعيل التأشيرة الإلكترونية لمقيمي دول الخليج وبحث سبل معالجتها	وكالة التعاون الدولي والشراكات	تم التواصل مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، والاتفاق على دراسة الموضوع من قبل الفرق المختصة ومتابعته، وموافاتنا بالمستجدات


19 إجمالي مشاريع سهيل

6 مكتملة

13 على المخطط

0 متأخرة

0 لم تبدأ

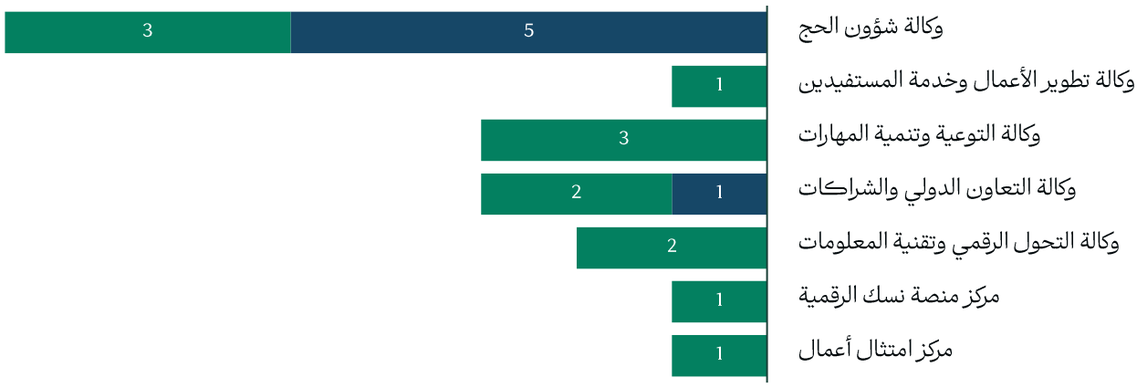

أبرز التحديثات


#	المشروع	القطاع	التحديث
1	ضيف بلا حقيبة	مركز امتثال أعمال	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** • تم استعراض خصائص منصة ضيف بلا حقيبة في عرض تجريبي على المطارات القابضة للمواءمة بتاريخ 3 نوفمبر 2026 • تم تعميم اتفاقية مستوى الخدمة على شركات تقديم الخدمة ومزودي الخدمة • تم الإعداد لجلسة حوارية في برنامج مجلس الحج في مؤتمر الحج • تم الإعداد لورشة عمل تفصيلية لمكاتب شؤون الحج وشركات تقديم الخدمة في مؤتمر الحج
2	نسك امتثال مراكز الضيافة	وكالة التعاون الدولي والشراكات	**تاريخ التحديث 05 نوفمبر 2026** • تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات في اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 2 نوفمبر 2026 • تم عقد اجتماع مع وكالة الخدمات المشتركة لاستعراض المقر البديل لمشروع نسك امتثال (مبنى 8) • تم استكمال التقييم الفني والمالي لعروض مشروع نسك امتثال، وإحالة النتائج إلى وكالة الخدمات المشتركة لاستكمال إجراءات الترسية

708 إجمالي المعاملات


402 مكتملة

306 على المخطط

0 متأخرة

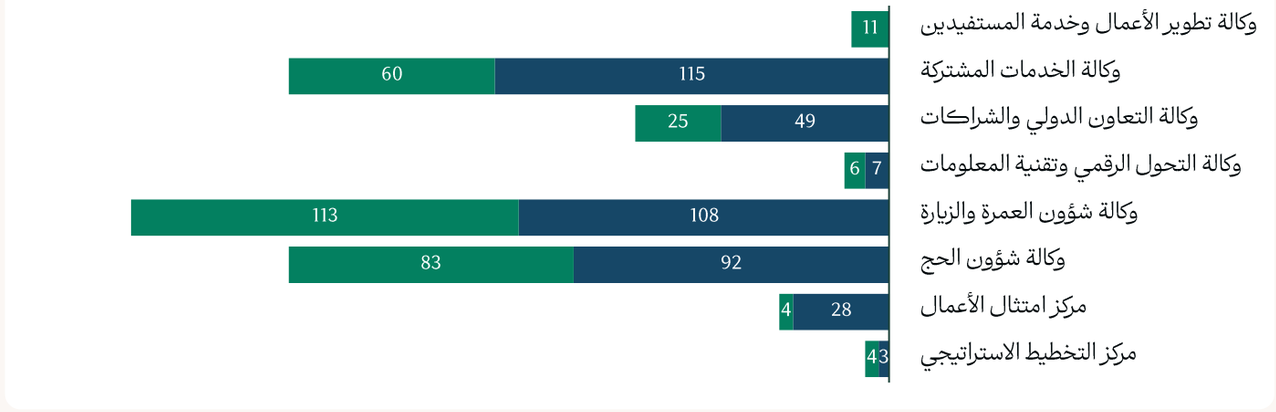


تجربة المستخدم

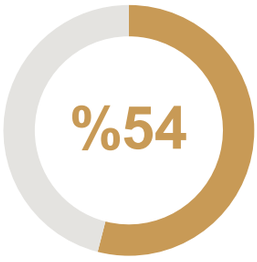


رضا المستفيد



التعامل مع الشكاوى

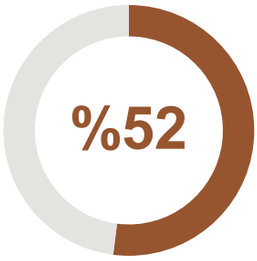


التقنيات والأدوات

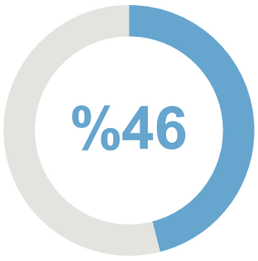

آلية الاحتساب: 10% للجاهزية وتشمل المتطلبات والاجتماعات والتنسيق، و5% لتحديد التواريخ المستهدفة، والنسبة المتبقية وفق الإنجاز الفعلي لمتطلبات الدليل.

نسبة الإنجاز حسب القطاع

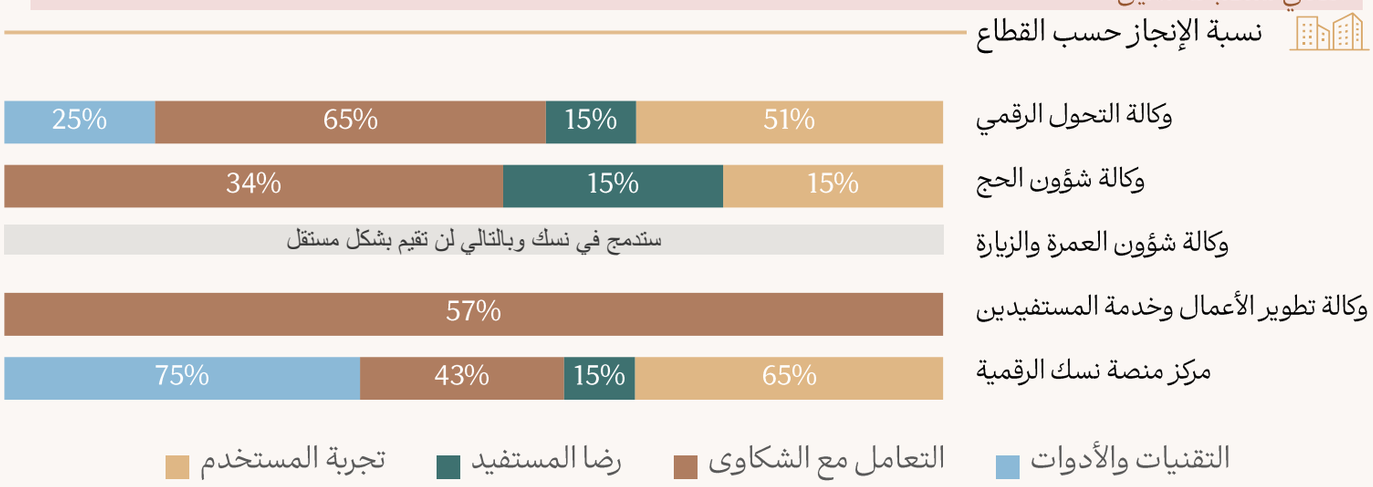

أبرز التحديثات

#	المنظور	التحديث
1	**تجربة المستخدم**	ارتفعت نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 54% بعد تحديث مهام التحول الرقمي، مع قرب اكتمال أحد المتطلبات. ومن المتوقع ارتفاع إنجاز أربعة متطلبات إلى 80% بعد اعتماد دمج المحتوى في منصة نسك والحل الانتقالي للنطاقات الفرعية
2	**التقنيات والأدوات**	بدأ تنفيذ مهام التحول الرقمي بنسبة إنجاز 25%، وتشمل منهجية واجهات البرمجة، وإتاحة البيانات غير الشخصية لمختبر تجربة نسك، وأدوات تحليل تجربة المستخدم، ووحدة الذكاء الاصطناعي، ليبلغ الإنجاز الإجمالي 46%
3	**التعامل مع الشكاوى**	• ارتفعت نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 52% بعد تحديث خطة الإدارة العامة لخدمات المستفيدين بتاريخ 28 أكتوبر • عدم اعتماد الشواهد حتى الآن، مع وجود خمسة متطلبات متأخرة وعدم تحديث كراسة مركز الاتصال
4	**جميع المناظير (الحج)**	عدم تجاوب الفريق رغم ثلاث محاولات للمتابعة، مع إمكانية تقليص المهام المتبقية إلى أقل من عشر مهام بعد اعتماد دمج المحتوى والصفحة الرئيسية ضمن منصة نسك



تفاصيل المهام

تفاصيل مشاريع سهيل

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	عقد اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية لمناقشة التحديات بخصوص إعادة تفعيل التأشيرة الإلكترونية لمقيمي دول الخليج وبحث سبل معالجتها	وكالة التعاون الدولي والشراكات	2026-11-04	مكتملة	تم التواصل مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، والاتفاق على دراسة الموضوع من قبل الفرق المختصة ومتابعته، وموافاتنا بالمستجدات.
2	إعداد وتنفيذ خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، تتضمن الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة واستكمال تنفيذها، وصولا إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضجها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2027-01-13	على المخطط	
3	دراسة توفير آلية بديلة للشراء للمستفيدين غير القادرين على إتمام عمليات الشراء عبر التطبيق مع بحث خيارات الدفع والتحويل المالي بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ومكاتب شؤون الحجاج	وكالة التعاون الدولي والشراكات	2026-11-18	على المخطط	
4	إعداد تصور لدراسة إمكانية تطبيق التسكين الذكي بواسطة بطاقة نسك في مساكن المعتمرين والاستفادة من التجربة في تسهيل إجراءات التسكين والتحقق من تقديم الخدمة	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-11-18	على المخطط	
5	عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمناقشة جميع التحديات المرتبطة ببطاقة بوابة مكة والمدينة، والخروج بحلول وتوصيات واضحة لمعالجتها، بما يدعم تطوير النموذج التشغيلي واستكمال متطلبات تنفيذ	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-11-11	على المخطط	
6	إعداد المتطلبات اللازمة لإضافة خدمة الحج المباشر إلى تطبيق نسك تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر التطبيق خلال العام القادم	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-18	على المخطط	
7	إعداد خطة تسويقية متكاملة للتعريف بالخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها عبر تطبيق نسك والتركيز على خدمة العمرة المباشرة المزمع إطلاقها والاستفادة من السفارات والوكلاء الخارجيين في دعم تسويقها والوصول إلى الفئات المستهدفة	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-18	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع القيادات)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
8	حصر وتصنيف جميع حالات المراجعة والاستفسارات المقدمة من المراجعين وتطوير آلية واضحة ومنظمة للتعامل معها بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين	مكتب معالي الوزير	2026-11-11	على المخطط	
9	دراسة آلية الإعلان عن إطلاق منصة (نبتكر) وتقييم مدى مناسبة الإعلان عنها عبر حساب معالي الوزير في منصات التواصل الاجتماعي والخروج بالتوصية المناسبة	وكالة التوعية وتنمية المهارات	2026-11-11	على المخطط	
10	إعداد عرض يستعرض ما تم إنجازه في مشروع حاج بلا حقيبة خلال مراحله المختلفة وأبرز الملاحظات والتحديات التي تم رصدها ومعالجتها مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية (سيتي تيرمينال) مع الخطوط السعودية في معالجة التحديات السابقة وتحسين تجربة الحجاج	برنامج خدمة ضيوف الرحمن	2026-11-11	على المخطط	

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	التنسيق مع وكالة التعاون الدولي لمتابعة وتنظيم زيارات كبار الشخصيات والوفود الرسمية خلال مؤتمر ومعرض الحج 2026 وإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبالهم في بوث وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-02	مكتملة	تم التنسيق مع وكالة التعاون الدولي
2	إعداد استراتيجية للمسار الإلكتروني لتطوير رحلة المستفيد	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-30	على المخطط	
3	متابعة واستكمال إجراءات تعميد مشروع قارئات نسك بالتنسيق مع وكالة الخدمات المشتركة	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-12	على المخطط	
4	إعداد قرار تشكيل اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي في قطاع الحج والعمرة بما يشمل تحديد اختصاصات اللجنة ومهامها وأدوارها ومسؤولياتها	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-16	على المخطط	
5	إعداد منهجية حوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الحج والعمرة، بما يشمل تحديد الأطر التنظيمية والسياسات والأدوار والمسؤوليات وآليات الإشراف والمتابعة	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-16	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
6	دراسة أنضج التجارب في تشغيل الخدمات الرقمية لدى مراكز الضيافة وتقييم إمكانية دمجها ضمن المسار الإلكتروني، بالتنسيق مع وكالة الحج	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-30	على المخطط	
7	تحديد موعد للاجتماع لمناقشة خدمة آلية طلبات تخصيص وحجز أبراج كدانة مع وكالة الحج	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-11-05	على المخطط	
8	دراسة إمكانية تفعيل المساعد الذكي على بوابة العاملين الموحد	وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات	2026-12-31	على المخطط	
9	إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك	مركز منصة نسك الرقمية	2026-11-11	على المخطط	
10	العمل على تطوير وتحسين نموذج Nusuk AI لموسم حج 1448هـ لتمكين من إرشاد المستخدم إلى شركات الحج المناسبة وفقا لتفضيلاته واحتياجاته من خلال عرض الخيارات المتاحة والخدمات المقدمة من كل شركة مع توجيهه إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للاطلاع على تقييمات الشركة	مركز منصة نسك الرقمية	2026-12-10	على المخطط	

تفاصيل المهام (لجنة المتابعة)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	بشأن المبادرة المقترحة لتنظيم عمرة شهر ذي القعدة، تم التوافق على ما يلي: مناسبة تنظيم عمرة شهر ذي القعدة وفق التصاريح الصادرة من منصة نسك. مناسبة تشكيل فريق إشرافي بقيادة وزارة الحج والعمرة وعضوية الجهات ذات العلاقة، لدراسة المقترح بمنظور شمولي يشمل الضوابط والاشتراطات، والفترة الزمنية والأعداد المستهدفة، والخطة الإعلامية، وخطة إخلاء مكة المكرمة ومغادرة المعتمرين بعد انتهاء الفترة المحددة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتزويد لجنة المتابعة بملخص تنفيذي عن نتائج أعمال الفريق	وكالة شؤون العمرة والزيارة	2026-12-06	على المخطط	

تفاصيل المهام

تفاصيل المهام (اللجنة الإشرافية)

#	المهمة	القطاع	تاريخ الإنجاز المخطط	الحالة	ملاحظات
1	دراسة استخدام كاميرا الجسم لممثل نسك امتثال المراقب الدائم وتقييم إيجابياتها وسلبياتها ومحاذير انتهاك الخصوصية المرتبطة بها وحوكمة بيانات التسجيلات والوصول إليها	وكالة شؤون الحج	2026-12-02	على المخطط	

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة شؤون الحج

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ	2026-08-30	2027-11-19	على المخطط	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** •تم الانتهاء من إعداد المحتوى لورش العمل التعريفية والتأهيلية لمشروع رحلة الحاج المتكاملة على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 5 نوفمبر 2026 •جار العمل على دليل ولوحة مؤشرات متابعة تفاصيل رحلة الحاج المتكاملة على أن يتم الانتهاء منها 12 نوفمبر 2026
2	دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق	2026-09-15	2026-11-30	على المخطط	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** تم الانتهاء من إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثل زيادة أعداد الحجاج - تسكين العمالة - زيادة المساحة المخصصة للحاج وتمت المراجعة من قبل مركز التخطيط الاستراتيجي وإبداء الرأي والملاحظات وبانتظار استيفائها
3	تطوير نموذج شركات حجاج الداخل	2026-06-16	11-12-2026	على المخطط	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** •تم اعتماد بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل •جار العمل على خطة تنفيذ بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل على أن بتم الانتهاء منها بتاريخ 12 نوفمبر 2026
4	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** •تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 •تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
5	أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري	2026-06-25	2026-07-25	مكتملة	**تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026** •تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 •تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
6	النموذج التشغيلي لقادة الأفواج	2026-06-16	2026-08-13	مكتملة	**تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026** •تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 •تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج •تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة
7	أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج	2026-06-16	2026-11-05	مكتملة	**تاريخ التحديث 22 أكتوبر 2026** تم استعراض واعتماد مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 19 أكتوبر 2026، مع أهمية التوسع التدريجي والمدروس في عدد شركات تقديم الخدمة لتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات وتشجيع دخول شركات أخرى لتقديم الخدمات اللوجستية في المدينة المنورة
8	إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري	2026-06-16	2026-07-31	مكتملة	**تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026** تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن	2026-06-11	2026-11-15	على المخطط	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** •تم اكتمال تجهيز منطقة جربني واستلام كافة النماذج الابتكارية وتجهيز آلية التجربة مع الزوار •جار التنسيق مع إدارة تصميم الهويات لتصميم نموذج هوية معتمد تمهيدا لتعميمها

وكالة التعاون الدولي والشراكات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	نسك امتثال مراكز الضيافة	2026-06-14	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 05 نوفمبر 2026** •تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات في اجتماع اللجنة الإشرافية بتاريخ 2 نوفمبر 2026 •تم عقد اجتماع مع وكالة الخدمات المشتركة لاستعراض المقر البديل لمشروع نسك امتثال (مبنى 8) •تم استكمال التقييم الفني والمالي لعروض مشروع نسك امتثال، وإحالة النتائج إلى وكالة الخدمات المشتركة لاستكمال إجراءات الترسية
2	برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية للشركات وجار العمل على ترسية المشروع
3	دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج	2026-06-14	2027-03-28	مكتملة	**تاريخ التحديث 05 نوفمبر 2026** •تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 •وإدراج نموذج آلية تنظيم قدوم حجاج دول الخليج لموسم حج 1449هـ ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها في مؤتمر ومعرض الحج.

وكالة التوعية وتنمية المهارات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تنظيم الهوية المؤسسية	2026-08-25	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** •تم البدء في أعمال تصميم لوسائل النقل على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 29 نوفمبر 2026 •تم الانتهاء من التصميم المبدئي الإبداعي للوحات شركات تقديم الخدمة وجار مراجعتها ومشاركتها مع الجهة المعنية داخليا للاعتماد على أن يتم الانتهاء منها بتاريخ 3 نوفمبر 2026
2	برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق	2026-06-16	2027-02-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 15 أكتوبر 2026** جار العمل على إعداد ملف حملة التوعية بالتفويج خلال أيام التشريق لموسم حج 1448هـ، ومن المستهدف الانتهاء منه بتاريخ 11 يناير 2027
3	برنامج لتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج	2026-07-15	2027-07-22	على المخطط	**تاريخ التحديث 05 نوفمبر 2026** تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع، واستكمال إعداد المحتوى والحقائب التدريبية وتجهيز فنادق التدريب والقاعات، على أن يبدأ تدريب البعثات يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2026م

تفاصيل مشاريع سهيل

وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة	2026-07-19	2027-06-20	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** •تم الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الهيكل المعدني في عرفات لبحث أفضل طريقة لتثبيت القارئات في مخيمات عرفات، إلى جانب متابعة حصر الحواجز التنظيمية بعرفات بهدف الاستعداد لتركيب القارئات فيها •تم إعداد ملف بمواصفات كاميرات المراقبة اللازم تثبيتها في المخيمات من قبل الشركات وتوضيح آلية ربطها مع منظومة قارئات نسك •تم تجهيز عينات للقارئات لعرضها في مؤتمر ومعرض الحج بجناح التحول الرقمي في رحلة الحاج
2	المنصة الموحدة للعاملين	2026-07-01	2027-07-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** •تم إطلاق أعمال الدورة الأولى وجاري العمل على إطلاق أعمال الدورة الثانية والانتها من تطوير خدمات التدريب بتاريخ 10 نوفمبر 2026 •سيتم استعراض خارطة طريق تنفيذ المشروع والتحديات والحل المقترح في اجتماع القبادات القادم الموافق 2 نوفمبر 2026

مركز منصة نسك الرقمية

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	تسويق تطبيق نسك	2026-06-30	2027-08-01	على المخطط	**تاريخ التحديث 29 أكتوبر 2026** تم استلام مرئيات إدارة المشتريات على كراسة الشروط والمواصفات، وجار العمل على معالجة الملاحظات ودراسة الخيارات والآليات المناسبة لطرح الكراسة

مركز امتثال أعمال

#	اسم المشروع	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	الحالة	ما تم حتى تاريخه
1	ضيف بلا حقيبة	2026-08-09	2027-03-23	على المخطط	**تاريخ التحديث 5 نوفمبر 2026** •تم استعراض خصائص منصة ضيف بلا حقيبة في عرض تجريبي على المطارات القابضة للمواءمة بتاريخ 3 نوفمبر 2026 •تم تعميم اتفاقية مستوى الخدمة على شركات تقديم الخدمة ومزودي الخدمة •تم الإعداد لجلسة حوارية في برنامج مجلس الحج في مؤتمر الحج •تم الإعداد لورشة عمل تفصيلية لمكاتب شؤون الحج وشركات تقديم الخدمة في مؤتمر الحج

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%51	%15	%65	%25

وكالة التحول الرقمي (1/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 51%			
INF-01	رفع توافريه المنصات إلى 99.99% فأعلى	%80	مكتمل جزئيا؛ يتبقى تأكيد طريقة الإثبات
INF-02	خفض زمن عرض المحتوى المرئي الأكبر إلى 2.5 ثانية فأقل	%50	منجز؛ يرتفع إلى 80% باعتماد دمج المحتوى في nusuk.sa
INF-03	ربط جميع المنصات بالنفاذ الوطني الموحد وتوحيد حساب المستفيد	%50	المنهجية والتواريخ معتمدة؛ بانتظار أول تشغيل
INF-04	توحيد البنية التقنية لأدوات إمكانية الوصول عبر جميع البوابات	%25	إعداد منهجية ضبط الواجهات ودمج توثيقها
INF-05	دمج المنصات تحت نطاق موحد بمسارات فرعية واستمرارية الجلسة	%50	حل انتقالي متفق عليه؛ يرتفع إلى 80% عند اعتماده
INF-06	توحيد سلوك شريط التصفح وثباته عبر المنصات والتطبيق	%50	حل انتقالي متفق عليه؛ يرتفع إلى 80% عند اعتماده
INF-07	تعميم أنماط الإدخال والنصوص الإرشادية في نظام التصميم الموحد	%50	حل انتقالي متفق عليه؛ يرتفع إلى 80% عند اعتماده
رضا المستفيد: 15%			
S-03	دعم رفع سرعة التصفح والأداء وخفض الأخطاء (مشتركة مع مركز منصة نسك)	%15	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التعامل مع الشكاوى: 65%			
CS-25	إصدار تقرير نسبة إتاحة منظومة الشكاوى خلال ساعات العمل	%52	متأخر؛ طلبت إعادة الشاهد وفق النموذج
CS-28	تطوير احتساب زمن الاستجابة لكل شكوى	%73	مكتمل جزئيا؛ الشاهد متوفر ويتبقى التطوير
CS-34	تقرير الطاقة الاستيعابية ونسبة إشغال الدائرة الهاتفية (SIP Trunk)	%84	متأخر؛ الشاهد متوفر مع نقص في عدد الخطوط
CS-36	تمكين تسجيل الشكوى وتوجيهها آليا عبر القنوات	%26	عبر البريد حاليا؛ مركز الاتصال ضمن العقد الجديد
CS-43	أولوية معالجة شكاوى كبار السن وذوي الإعاقة	%68	تصنيف CRM مكتمل؛ تطوير المشجرة جار
CS-55	إضافة زمن معالجة الشكوى	%100	مكتمل
CS-59	إضافة عدد مرات إعادة فتح الشكوى	%53	التطوير مكتمل؛ بانتظار بيانات الفترة كاملة
التقنيات والأدوات: 25%			
INF-08	واجهات البرمجة والحلول السحابية واستكمال توثيق الإطار التكاملي	%25	الملف يسلم منتصف الأسبوع ثم تناقش المنهجية
INF-09	جمع بيانات المستفيدين عبر القنوات ومستودع بيانات التجربة الرقمية	%25	قيد النقاش مع محللي البيانات ووكالة الإعلام وCRM
INF-10	تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي وتكاملها مع الأنظمة الداخلية	%25	دراسة قدرة Contentsquare على التنفيذ

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%51	%15	%65	%25

وكالة التحول الرقمي (2/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التقنيات والأدوات: 25%			
INF-11	وصول المصممين والمطورين إلى مستودع البيانات	%25	منح فريق المختبر الصلاحيات اللازمة للوصول إلى البيانات غير الشخصية
INF-12	منصة التجربة الرقمية الموحدة ونظام العمل المرن	%25	دراسة قدرة Contentsquare على التنفيذ
INF-13	أنظمة التكامل وواجهات البرمجة بين تطبيقات المنصة والأنظمة الداعمة	%25	إعداد منهجية ضبط الواجهات ودمج توثيقها
INF-14	أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة الداعمة للتجربة الرقمية	%25	قيد النقاش مع وحدة الذكاء الاصطناعي لجمع الملفات

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	تجربة المستخدم (51%): قرب اكتمال أحد المتطلبات، ومن المتوقع ارتفاع إنجاز أربعة متطلبات إلى 80% بعد اعتماد دمج المحتوى في منصة نسك والحل الانتقالي للنطاقات الفرعية
2	التقنيات والأدوات (25%): يجري مناقشة المهام وتحديد منهجيات تنفيذها، وتشمل واجهات البرمجة، وإتاحة البيانات غير الشخصية لمختبر تجربة نسك، وأدوات تحليل تجربة المستخدم، ووحدة الذكاء الاصطناعي
3	التعامل مع الشكاوى (65%): اكتمال متطلب زمن معالجة الشكاوى، مع تأخر تقرير إتاحة المنظومة ومعالجة نقص الخطوط الهاتفية

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%15	%15	%34	لا ينطبق

وكالة شؤون الحج

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 15%			
UX-02	معالجة نماذج التسجيل وحقول الإدخال ومكون اختيار التاريخ	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-03	تصحيح رسائل الأخطاء وضبط تفعيل أزرار الإجراء	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-04	مؤشر التقدم وحفظ المدخلات وتجديد الجلسة في الرحلات الممتدة	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-05	تنسيق المحتوى ومراجعة الروابط وإتاحة المستندات بأنساق ميسرة	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-06	ضبط الدلالات التفاعلية للبطاقات والأزرار	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
UX-07	رفع سرعة عرض المحتوى المرئي الأكبر على الجوال وسطح المكتب	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
TD-18..01	معالجة ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك حج (18 ملاحظة)	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
رضا المستفيد: 15%			
US-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية ودعوتهم للتقييم وقياس تلبية التطلعات	%15	جاهزية + تحديد التواريخ
التعامل مع الشكاوى: 34%			
CS-05	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك حج	%15	متأخر؛ ستضاف أيقونة للشروط والأحكام
CS-12	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%80	متأخر؛ قنوات الوزارة متاحة ويتبقى التواصل الاجتماعي
CS-20	نشر ساعات العمل لاستقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%40	متأخر؛ ساعات العمل متوفرة ومرتبط بالمتطلب 1.2
CS-76	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك حج	%0	لم يبدأ؛ مرتبط بتحديث دليل الاستقبال والاتفاقيات

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	مهام الوكالة: من المتوقع انخفاض المهام المتبقية إلى أقل من 10 مهام بعد اعتماد دمج المحتوى والصفحة الرئيسية في منصة نسك، مما يحد من أثر التأخر الحالي

التحديات

#	التحدي
1	تأخر التجاوب: عدم تجاوب فريق الوكالة رغم إرسال ثلاث رسائل متابعة، آخرها بتاريخ 4 نوفمبر 2026، مع إشراك وكيل التحول الرقمي والرئيس التنفيذي للحج المباشر
2	التعامل مع الشكاوى (34%): تأخر ثلاثة متطلبات عن الموعد المحدد في 15 أكتوبر، تشمل الشروط والأحكام، وقنوات التواصل، وساعات العمل في نسك حج

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
معلق	معلق	معلق	معلق

وكالة شؤون العمرة والزيارة

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
U-09..01	مهام تجربة المستخدم في منصة نسك عمرة (9 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
TD-10..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك عمرة (10 ملاحظات)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
S-05..01	مهام رضا المستفيد في منصة نسك عمرة (5 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
N-05..01	مهام التقنيات والأدوات لمنصة نسك عمرة (5 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل
CS-06/13/21/77	نشر متطلبات الشكاوى في منصة نسك عمرة (4 مهام)	معلق	ستدمج في نسك ولن تقيم بشكل مستقل

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	ستدمج منصة نسك عمرة في نسك ولن تقيم بشكل مستقل؛ المطلوب الإسراع في نقلها خارج نطاق نسك بحيث لا تبقى على umrah.nusuk.sa قبل بدء القياس

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
لا ينطبق	لا ينطبق	%57	لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين (1/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 57%			
1	دليل الشروط والأحكام لكل قناة (CS-01..09)	%82	متأخر؛ نشر في نسك والبوابة ويتبقى حج وعمرة ومسار
2	عدد قنوات استقبال الشكاوى (CS-10..17)	%53	قنوات إضافية مرتبطة بكراسة مركز الاتصال
3	ساعات العمل لاستقبال الشكاوى (CS-18..23)	%57	متأخر؛ ساعات العمل متبقية في بعض المنصات
4	نسبة إتاحة منظومة الشكاوى (CS-24..25)	%52	متأخر؛ طلبت إعادة الشاهد وفق النموذج
5	متوسط زمن الاستجابة للشكوى (CS-26..29)	%87	التقرير صادر؛ يتبقى تطوير البيانات الكاملة
6	نسبة الفقد للتفاعلات (CS-30..32)	%65	تقرير الفقد مكتمل؛ الدردشة الحية ضمن الكراسة
7	نسبة إشغال الدائرة الهاتفية (CS-33..34) SIP Trunk	%84	متأخر؛ الشاهد متوفر مع نقص في عدد الخطوط
8	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا (CS-35..40) 1/2	%23	مرتبط بالتطوير التقني وكراسة مركز الاتصال
9	نسبة الشكاوى التي يتم الرد عليها آليا (CS-41) 2/2	%0	لم يبدأ؛ مرتبط بإنجاز المؤشر 8
10	آلية رصد الشكاوى وتصنيف فئات المستفيدين (CS-42..47)	%52	تصنيف CRM مكتمل؛ المشجرة والاتصال المرئي قائمان
11	الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (CS-48..52)	%52	التقرير مكتمل؛ النشر مرتبط بتحديث الاتفاقيات
12	متوسط زمن الحل للشكوى (CS-53..57)	%100	مكتمل
13	حل المشكلة من أول تواصل (CS-58..63) FCR	%78	التطوير مكتمل؛ يتبقى ربط النتائج بالتذاكر
14	مبادرات تطوير منظومة الشكاوى من مرئيات المستفيدين (CS-64..65)	%41	بيانات الشكاوى سلمت لإعداد المبادرات
15	مبادرات معالجة مسببات الشكاوى (CS-66)	%70	قيد التنفيذ؛ 8 مبادرات مرصودة
16	نسبة الشكاوى على الخدمات الرقمية (CS-67..70)	%60	متأخر؛ متوفر لنسك والتطبيق ونسك حج فقط
17	تطوير رحلة المستفيد (CS-71..72)	%50	مرتبط باستكمال المؤشرين 14 و15

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
لا ينطبق	لا ينطبق	%57	لا ينطبق

وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين (2/2)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 57%			
18	دليل استقبال الشكاوى عربي وإنجليزي (CS-73..80-)	%19	الدليل معد؛ بانتظار مواءمته مع تحديث الاتفاقيات

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	مستوى الإنجاز (57%): ارتفع متوسط إنجاز الوكالة وفق خطة 28 أكتوبر، إلا أن نسبة الشواهد المعتمدة لا تزال 0%، مع تأخر خمسة متطلبات، أبرزها إتاحة المنظومة ونقص خطوط الدائرة الهاتفية
2	حسابات التواصل الاجتماعي: يجري التنسيق مع وكالة الإعلام لفصل الحسابات الإعلانية عن حسابات استقبال الشكاوى، وتحديد المسؤوليات من خلال مصفوفة RACI لكل حساب ومشغل

التحديات

#	التحدي
1	توحيد قنوات خدمة العملاء: تعدد قنوات الخدمة بين نسك ونسك حج ونسك مسار، مع احتمالية زيادة الضغط على فرق الخدمة في حال دمجها دون استكمال الجاهزية
2	أتمتة الشكاوى: عدم وجود ربط آلي لنقل شكاوى التواصل الاجتماعي إلى نظام CRM ، مما يزيد احتمالية إغفال الشكاوى والاعتماد على المعالجة اليدوية، مع التوصية بأتمتتها أو تضمينها ضمن كراسة مركز الاتصال
3	كراسة مركز الاتصال: عدم وجود مستجدات بشأن إعداد الكراسة، مع أهمية إحراز تقدم رسمي قبل نهاية ديسمبر لإدراجه ضمن الشواهد المعتمدة

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%43	%75

مركز منصة نسك الرقمية (1/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65%			
W-01	التصفح والبحث: مسار التصفح والقوائم وسلوك البحث	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-02	اتساق التصميم والأيقونات والمحاذاة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-03	المحتوى والطباعة والتباين وأدلة الخدمات	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-04	التفاعلات غير المتوقعة واستجابة المنصة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-05	رسائل الأخطاء ووسائل المساعدة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-06	الخصوصية والثقة: الروابط الثابتة والإشعار عند جمع البيانات	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-07	حالات الأزرار وبنية البطاقات والقوائم وتحسين محركات البحث	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-08	التكبير 200% وترتيب التنقل بلوحة المفاتيح وأحجام الأزرار	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-09	النافذة الواحدة وحفظ الطلب ومؤشرات الأثر الرقمي	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-10	سجل البحث وشاهدت مؤخرا والحفظ المؤقت والمفضلة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
W-11	استبدال مكون اختيار التاريخ في منصة نسك	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-01	البحث والتصفح في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-02	المحتوى والتباين والمساحات والألوان والترجمة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-03	مؤشر التقدم وأزرار التنقل والرجوع وحفظ المسودة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-04	الحقول الإلزامية ورسائل الأخطاء وقواعد التحقق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-05	دليل الخدمة المصور وسياسة الخصوصية في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-06	إتاحة التطبيق على مختلف الأجهزة	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-07	مؤشرات الأثر الرقمي وحفظ الطلب في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-08	المفضلة والحفظ المؤقت في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار
A-09	استبدال مكون اختيار التاريخ في التطبيق	%80	سلمت للتطوير بانتظار بيئة الاختبار

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%43	%75

مركز منصة نسك الرقمية (2/3)

م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
تجربة المستخدم: 65%			
TD-15..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في منصة نسك (15 ملاحظة، 499 حالة)	%85	تقدم فعلي في التنفيذ
MSR-01	نسك مسار: أزرار الرجوع والمحاذاة والتوجيه والتنبيهات ومكون التاريخ	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-02	نسك مسار: حقول الإدخال والنصوص الإرشادية في نماذج التسجيل	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-03	نسك مسار: البطاقات والتباين والخط العربي والنص البديل	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-04	نسك مسار: أحجام الأزرار وترتيب التنقل ومؤشر التركيز والترجمات النصية	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
MSR-05	نسك مسار: التخصيص والمفضلة ومؤشرات الأثر الرقمي	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
TD-15..01	ملاحظات إمكانية الوصول التقنية في نسك مسار (15 ملاحظة، 177 حالة)	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
رضا المستفيد: 15%			
S-01	نشر استبانة (قيم تجربتك الرقمية) على المنصة والتطبيق	%40	الاستبانة جاهزة؛ التفعيل بالنافذة المنبثقة قائم
S-02	تحديث المحتوى والمعلومات وضمان دقتها وحداثتها	%15	مرتبط بتعيين مالك المحتوى
S-03	رفع سرعة التصفح والتنقل والأداء وخفض الأخطاء	%15	مرتبط بمهام التحول الرقمي INF-01 و INF-02
S-04	فاعلية الدعم وسرعة الاستجابة على القنوات الرقمية	%10	جاهزية
S-05	إشراك المستفيدين في الأنشطة الرقمية وقياس تلبية التطلعات	%20	أنشطة قائمة؛ دليل القياس لم يكتمل
DS-05..01	نسك مسار: الاستبانة، المحتوى، الأداء، الدعم، إشراك المستفيدين (5 مهام)	%10	قيد الدراسة مع الفرق المعنية
التعامل مع الشكاوى: 43%			
CS-07	نشر دليل الشروط والأحكام في منصة نسك	%100	تم النشر
CS-08	نشر دليل الشروط والأحكام في تطبيق نسك	%100	تم النشر (23 أكتوبر)
CS-09	نشر دليل الشروط والأحكام في نسك مسار	%10	أفادت نسك مسار بأنها لا تخدم الأفراد
CS-14	نشر قنوات استقبال الشكاوى في منصة وتطبيق نسك	%95	مكتمل جزئيا؛ يتبقى إضافة أسماء الحسابات
CS-15	نشر قنوات استقبال الشكاوى في نسك مسار	%10	أفادت نسك مسار بأنها لا تخدم الأفراد
CS-22	نشر ساعات العمل في منصة وتطبيق نسك	%50	متأخر؛ أضيفت في المنصة ويتبقى التطبيق
CS-23	نشر ساعات العمل في نسك مسار	%10	أفادت نسك مسار بأنها لا تخدم الأفراد

تفاصيل مؤشر نضج التجربة الرقمية

تجربة المستخدم	رضا المستفيد	التعامل مع الشكاوى	التقنيات والأدوات
%65	%15	%43	%75

مركز منصة نسك الرقمية (3/3)


م	المهمة	الإنجاز	أساس التقييم
التعامل مع الشكاوى: 43%			
CS-52	إصدار قائمة الخدمات وعدد الطلبات لكل خدمة	%52	متوفر للتطبيق والمنصة؛ يتبقى حج وعمرة ومسار
CS-78	نشر دليل استقبال الشكاوى في منصة نسك	%0	لم يبدأ؛ مرتبط بتحديث دليل الاستقبال والاتفاقيات
CS-79	نشر دليل استقبال الشكاوى في تطبيق نسك	%0	لم يبدأ؛ مرتبط بتحديث دليل الاستقبال والاتفاقيات
التقنيات والأدوات: 75%			
N-01	استراتيجية التقنية والمبادئ ورصد التقنيات الناشئة والأتمتة (نسك ونسك مسار)	%90	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-02	إطار جمع البيانات وتصنيفها وحوكمتها وسياسة الخصوصية	%70	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-03	أدوات التحليل ولوحات ذكاء الأعمال والتحليلات التنبؤية	%60	اللوحات قائمة؛ التحليلات التنبؤية قيد البناء
N-04	منهجية وأدوات تصميم الرحلات والتصميم التشاركي	%75	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل
N-05	أدوات الاستماع الاجتماعي وأنظمة التجربة الرقمية	%80	دليل دورة 2026 قائم؛ قيد العمل

أبرز التحديثات

#	التحديث
1	توحيد ملكية المحتوى: يجري التنسيق مع وكالة الإعلام لتحديد مالك موحد لمحتوى صفحات نسك، مع دراسة دمج المحتوى بالكامل في الصفحة الرئيسية لمنصة نسك nusuk.sa، تمهيدا لاعتماد الحل النهائي

التحديات

#	التحدي
1	إدارة المحتوى: عدم وجود مالك موحد لمحتوى صفحات نسك، مما يؤثر على اتساق المحتوى واستكمال متطلبات رضا المستفيد، لحين اعتماد الحل بالتنسيق مع وكالة الإعلام
2	دليل استقبال الشكاوى: ارتباط نشر الدليل عبر المنصة والتطبيق باستكماله من وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين
3	قائمة الخدمات: ارتباط قياس مؤشرين ضمن محور الشكاوى باستكمال قائمة الخدمات واعتمادها

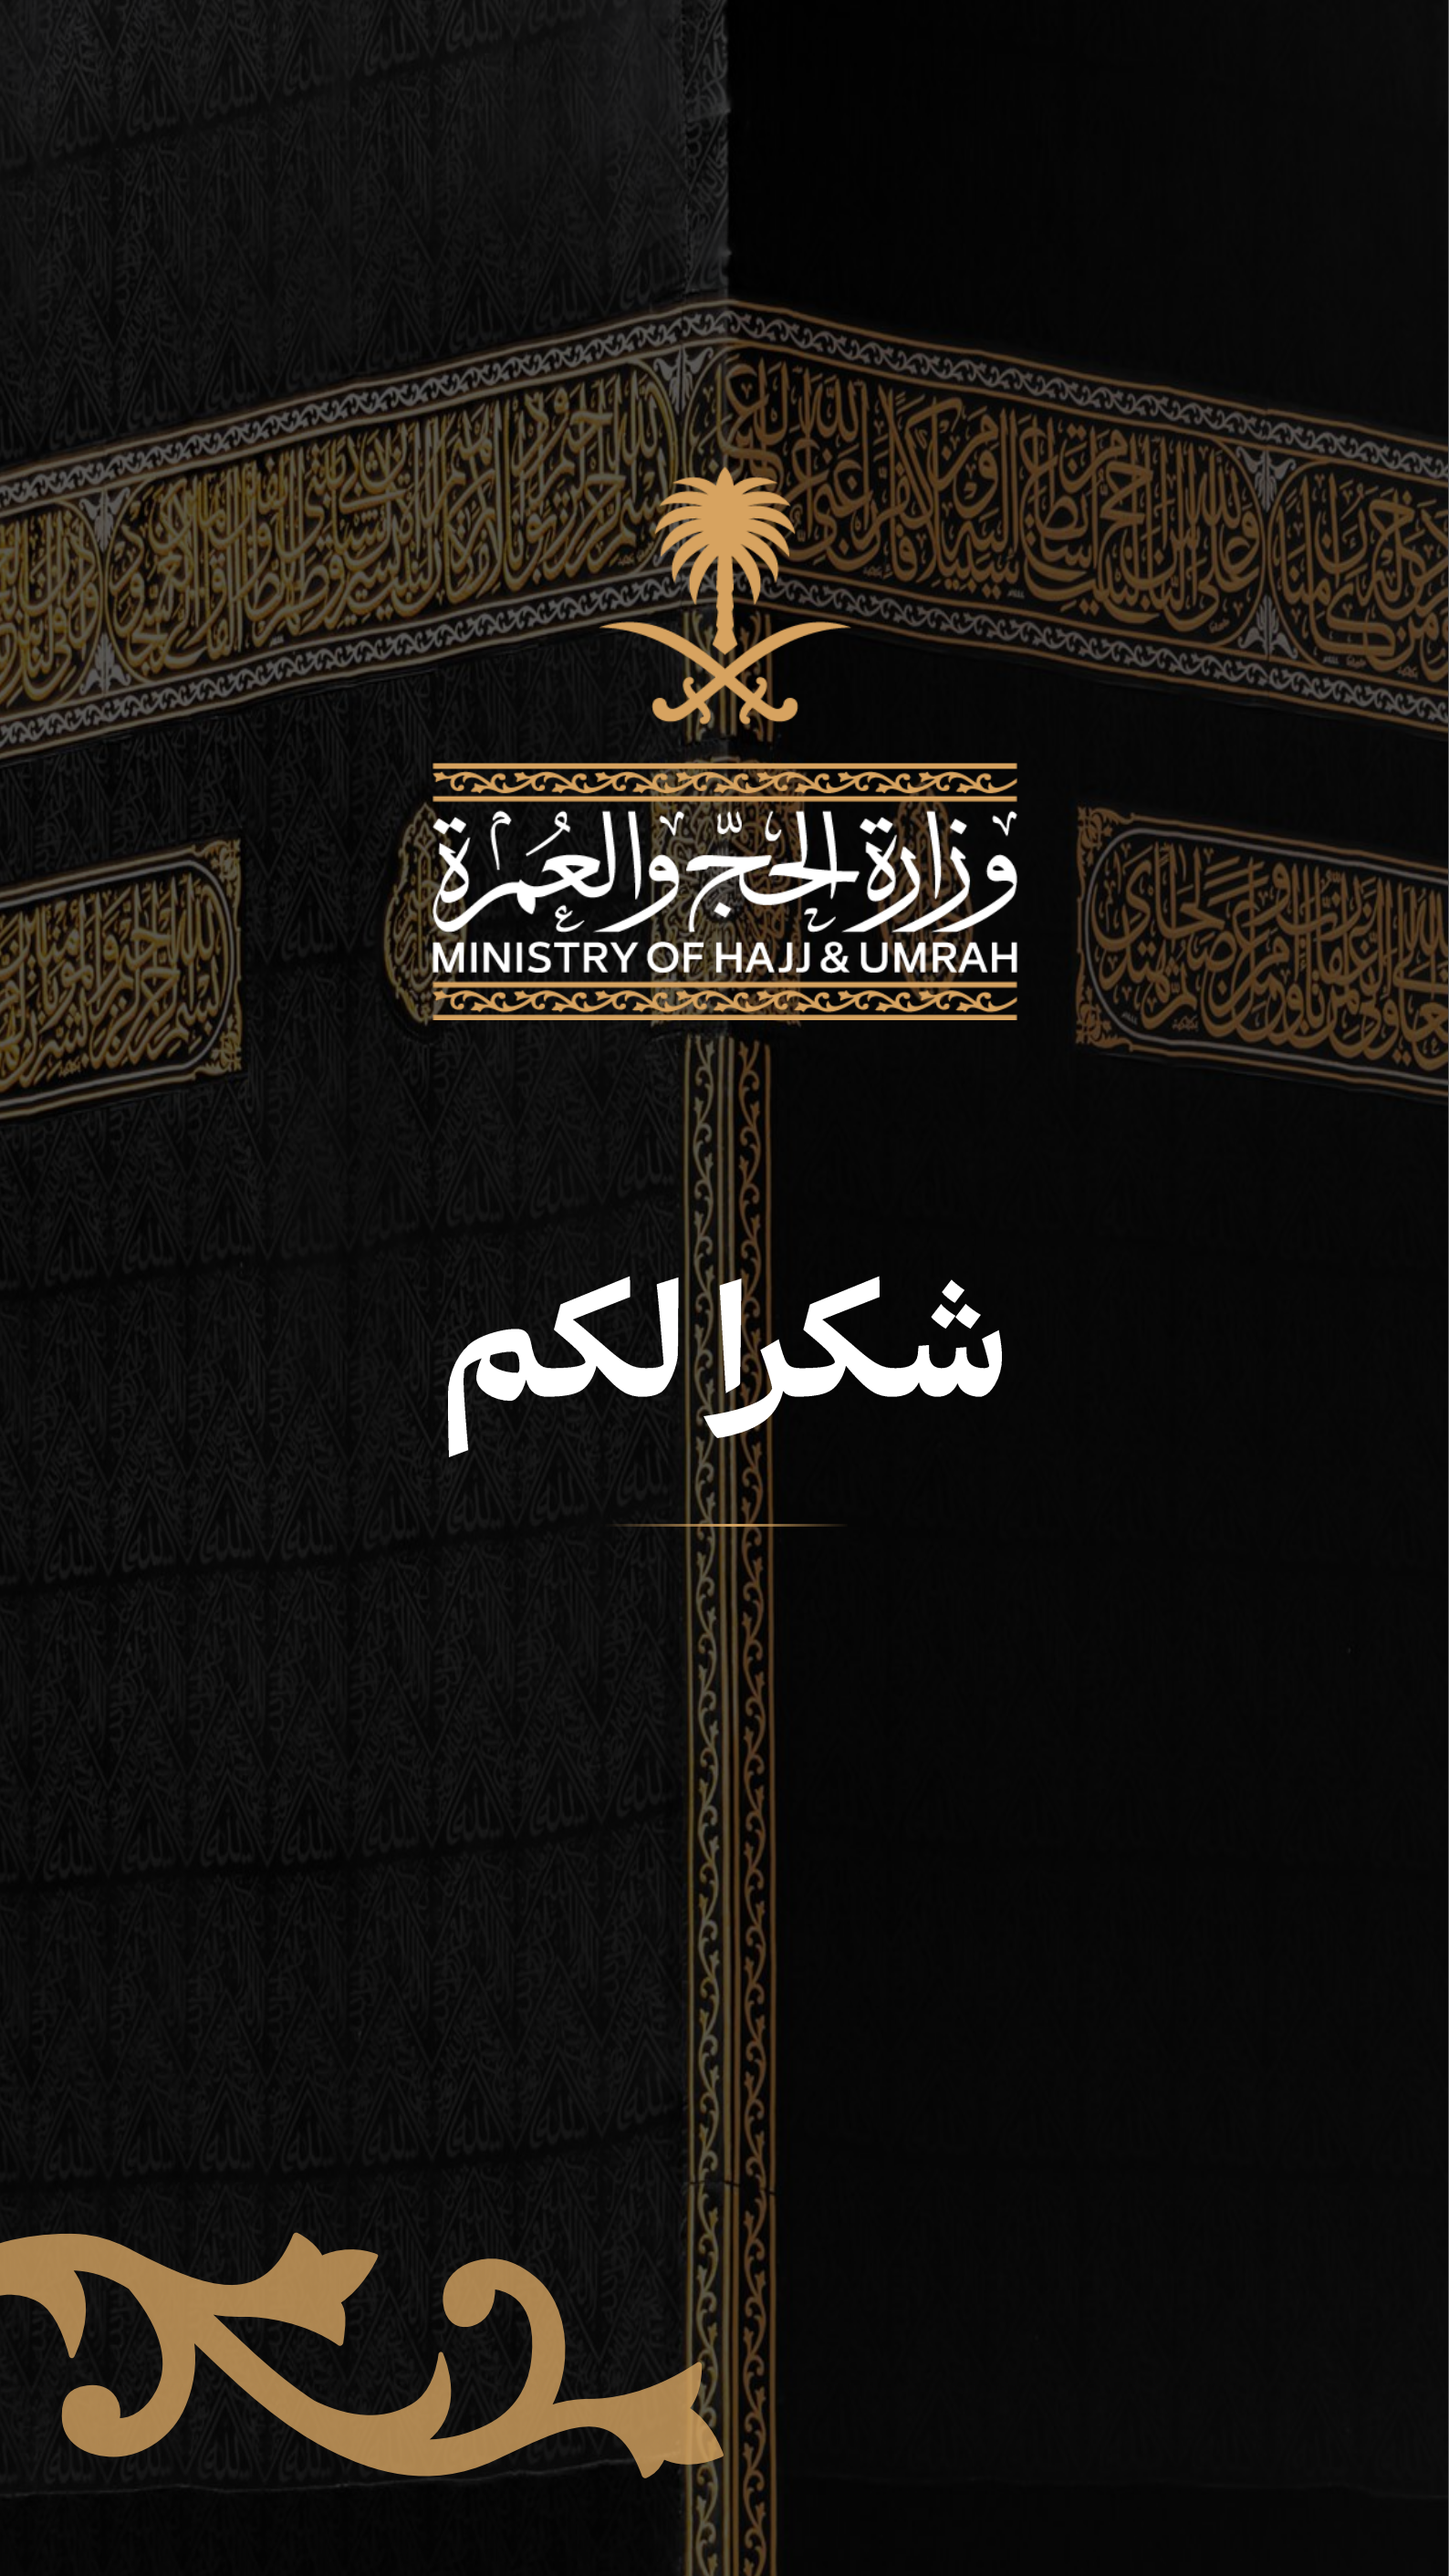
وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ & UMRAH
شكرا لكم
